ID	№ и Наименования на задължителните елементи	Дейности и действия	организация на персонала и ресурсите	Календар дни	НАЧАЛО	КРАЙ	ПОСЛЕДОВАТЕЛИ	Рискове	КАЛЕНДАРНИ ДНИ
1	**ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА**			**8 дни**	**Wed 4.1.17**	**Wed 11.1.**			**8 days**
2	Индикативна дата за старт на изпълнение на договора			0 дни	Wed 4.1.17	Wed 4.1.17			0 days
3	I.ЕТАП НА ЖИЗНЕНИЯ ЦИКЪЛ НА ПЛАНИРАНЕТО	ЕТАП НА ЖИЗНЕНИЯ ЦИКЪЛ НА ПЛАНИРАНЕТО ОБХВАЩАШ ПОДГОТОВИТЕЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ И РЕСУРСИТЕ		4 дни	Wed 4.1.17	Sat 7.1.17			4 days
39	II.ЕТАП НА ЖИЗНЕНИЯ ЦИКЪЛ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО	ЕТАП НА ЖИЗНЕНИЯ ЦИКЪЛ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО ОБХВАЩАШ ИЗПЪЛНЕНИЕТО ПОДГОТОВИТЕЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ, ВСИЧКИ ДЕЙНОСТИ И ПОД-ДЕЙНОСТИ, ПРИЛАГАНЕ НА СЪОТВЕТНИТЕ РЕСУРСИ, МЕРКИ И МЕТОДИ		8 дни	Wed 4.1.17	Wed 11.1.17			8 days
77	III.ЕТАП НА ЖИЗНЕНИЯ ЦИКЪЛ НА КОНТРОЛИРАНЕТО	ЕТАП НА ЖИЗНЕНИЯ ЦИКЪЛ НА КОНТРОЛИРАНЕТО ОБХВАЩАШ КОНТРОЛИРАНЕТО НА ПОДГОТОВИТЕЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ, ВСИЧКИ ДЕЙНОСТИ И ПОД-ДЕЙНОСТИ, ПРИЛАГАНЕ НА СЪОТВЕТНИТЕ РЕСУРСИ, МЕРКИ И МЕТОДИ		8 дни	Wed 4.1.17	Wed 11.1.17			8 days
78	III.1.Основен етап на планирането	Основен етап на Планиране на Подготвителните дейности, всички дейности и под-дейности, прилагане на съответните ресурси, мерки и методи		4 дни	Wed 4.1.17	Sat 7.1.17			4 days
79	III.1.1.Под-етап на планирането	Под-етап на Планиране на Подготвителните дейности, всички дейности и под-дейности, прилагане на съответните ресурси, мерки и методи		4 дни	Wed 4.1.17	Sat 7.1.17			4 days
80	III.1.1.1.дейности на поръчката на планирането	Дейностите на Обособената позиция Дейност №1 и №2	ЕКСПЕРТИТЕ отразени в т. II.1 и III от ТП, както и съответните средствата и продукти отразени в т.1.1. от ТП	4 дни	Wed 4.1.17	Sat 7.1.17	2	Риск: от №1,до17; Предпоставки: от №1,до17; Мерки за управление: от №1,до17; Мерки за контролиране: от №1,до17; Аспекти на проява: от №1,до17; Числовата оценка на рисковете: от №1,до17; Числова оценка на предпоставките:от №1,до17	4 days
81	III.1.1.2.Дейност допълнително дефинирана от участника на планирането	Дейност на осъществяване на Планиране на Подготвителните дейности, всички дейности и под-дейности, прилагане на съответните ресурси, мерки и методи		4 дни	Wed 4.1.17	Sat 7.1.17			4 days
82	III.1.1.2.1.под-дейности на планирането	Под-дейност на осъществяване на Планиране на Подготвителните дейности, всички дейности и под-дейности, прилагане на съответните ресурси, мерки и методи	ЕКСПЕРТИТЕ отразени в т. II.1 и III от ТП, както и съответните средствата и продукти отразени в т.1.1. от ТП	4 дни	Wed 4.1.17	Sat 7.1.17	2	Риск: от №1,до17; Предпоставки: от №1,до17; Мерки за управление: от №1,до17; Мерки за контролиране: от №1,до17; Аспекти на проява: от №1,до17; Числовата оценка на рисковете: от №1,до17; Числова оценка на предпоставките:от №1,до17	4 days
83	III.1.1.3.общи мерки на планирането	Мерките по управление на качеството, по опазване на околната среда и по осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, които са описани в техническо предложение	ЕКСПЕРТИТЕ отразени в т. II.1 и III от ТП, както и съответните средствата и продукти отразени в т.1.1. от ТП	4 дни	Wed 4.1.17	Sat 7.1.17	2	Риск: от №1,до17; Предпоставки: от №1,до17; Мерки за управление: от №1,до17; Мерки за контролиране: от №1,до17; Аспекти на проява: от №1,до17; Числовата оценка на рисковете: от №1,до17; Числова оценка на предпоставките:от №1,до17	4 days
84	III.1.1.4.Общи методи - методи на контрол и на управление на рисковете на планирането	Методи на контрол и управление на рисковете, ще се извършат, съгласно описаните и дефинирани рискове, предпоставки, мерки за управление, мерки за контролиране и аспекти на проява отразени в техническото предложение	ЕКСПЕРТИТЕ отразени в т. II.1 и III от ТП, както и съответните средствата и продукти отразени в т.1.1. от ТП	4 дни	Wed 4.1.17	Sat 7.1.17	2	Риск: от №1,до17; Предпоставки: от №1,до17; Мерки за управление: от №1,до17; Мерки за контролиране: от №1,до17; Аспекти на проява: от №1,до17; Числовата оценка на рисковете: от №1,до17; Числова оценка на предпоставките:от №1,до17	4 days
85	III.2.Основен етап на изпълнението	Основен етап на Изпълнение на Подготвителните дейности, всички дейности и под-дейности, прилагане на съответните ресурси, мерки и методи		8 дни	Wed 4.1.17	Wed 11.1.17			8 days
86	III.2.1.Под-етап на изпълнението	Под-етап на Изпълнение на Подготвителните дейности, всички дейности и под-дейности, прилагане на съответните ресурси, мерки и методи		8 дни	Wed 4.1.17	Wed 11.1.17			8 days
87	III.2.1.1.дейности на поръчката на изпълнението	Дейностите на Обособената позиция Дейност №1 и №2	ЕКСПЕРТИТЕ отразени в т. II.1 и III от ТП, както и съответните средствата и продукти отразени в т.1.1. от ТП	8 дни	Wed 4.1.17	Wed 11.1.17	2	Риск: от №1,до17; Предпоставки: от №1,до17; Мерки за управление: от №1,до17; Мерки за контролиране: от №1,до17; Аспекти на проява: от №1,до17; Числовата оценка на рисковете: от №1,до17; Числова оценка на предпоставките:от №1,до17	8 days
88	III.2.1.2.Дейност допълнително дефинирана от участника на изпълнението	Дейност на осъществяване на Изпълнение на Подготвителните дейности, всички дейности и под-дейности, прилагане на съответните ресурси, мерки и методи		8 дни	Wed 4.1.17	Wed 11.1.17			8 days
89	III.2.1.2.1.под-дейности на изпълнението	Под-дейност на осъществяване на изпълнение на Подготвителните дейности, всички дейности и под-дейности, прилагане на съответните ресурси, мерки и методи	ЕКСПЕРТИТЕ отразени в т. II.1 и III от ТП, както и съответните средствата и продукти отразени в т.1.1. от ТП	8 дни	Wed 4.1.17	Wed 11.1.17	2	Риск: от №1,до17; Предпоставки: от №1,до17; Мерки за управление: от №1,до17; Мерки за контролиране: от №1,до17; Аспекти на проява: от №1,до17; Числовата оценка на рисковете: от №1,до17; Числова оценка на предпоставките:от №1,до17	8 days
90	III.2.1.3.общи мерки и на изпълнението	Мерките по управление на качеството, по опазване на околната среда и по осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, които са описани в техническо предложение	ЕКСПЕРТИТЕ отразени в т. II.1 и III от ТП, както и съответните средствата и продукти отразени в т.1.1. от ТП	8 дни	Wed 4.1.17	Wed 11.1.17	2	Риск: от №1,до17; Предпоставки: от №1,до17; Мерки за управление: от №1,до17; Мерки за контролиране: от №1,до17; Аспекти на проява: от №1,до17; Числовата оценка на рисковете: от №1,до17; Числова оценка на предпоставките:от №1,до17	8 days
91	III.2.1.4.Общи методи - методи на контрол и на управление на рисковете на планирането	Методи на контрол и управление на рисковете, ще се извършат, съгласно описаните и дефинирани рискове, предпоставки, мерки за управление, мерки за контролиране и аспекти на проява отразени в техническото предложение	ЕКСПЕРТИТЕ отразени в т. II.1 и III от ТП, както и съответните средствата и продукти отразени в т.1.1. от ТП	8 дни	Wed 4.1.17	Wed 11.1.17	2	Риск: от №1,до17; Предпоставки: от №1,до17; Мерки за управление: от №1,до17; Мерки за контролиране: от №1,до17; Аспекти на проява: от №1,до17; Числовата оценка на рисковете: от №1,до17; Числова оценка на предпоставките:от №1,до17	8 days
92	III.3.Основен етап на контролирането	Основен етап на Контролиране на Подготвителните дейности, всички дейности и под-дейности, прилагане на съответните ресурси, мерки и методи		8 дни	Wed 4.1.17	Wed 11.1.17			8 days
93	III.3.1.Под-етап на контролирането	Под-етап на Контролиране на Подготвителните дейности, всички дейности и под-дейности, прилагане на съответните ресурси, мерки и методи		8 дни	Wed 4.1.17	Wed 11.1.17			8 days
94	III.3.1.1.дейности на поръчката на контролирането	Дейностите на Обособената позиция Дейност №1 и №2	ЕКСПЕРТИТЕ отразени в т. II.1 и III от ТП, както и съответните средствата и продукти отразени в т.1.1. от ТП	8 дни	Wed 4.1.17	Wed 11.1.17	2	Риск: от №1,до17; Предпоставки: от №1,до17; Мерки за управление: от №1,до17; Мерки за контролиране: от №1,до17; Аспекти на проява: от №1,до17; Числовата оценка на рисковете: от №1,до17; Числова оценка на предпоставките:от №1,до17	8 days
95	III.3.1.2.Дейност допълнително дефинирана от участника на контролирането	Дейност на осъществяване на Контролиране на Подготвителните дейности, всички дейности и под-дейности, прилагане на съответните ресурси, мерки и методи		8 дни	Wed 4.1.17	Wed 11.1.17			8 days
96	III.3.1.2.1.под-дейности на контролирането	Под-дейност на осъществяване на контролирането на Подготвителните дейности, всички дейности и под-дейности, прилагане на съответните ресурси, мерки и методи	ЕКСПЕРТИТЕ отразени в т. II.1 и III от ТП, както и съответните средствата и продукти отразени в т.1.1. от ТП	8 дни	Wed 4.1.17	Wed 11.1.17	2	Риск: от №1,до17; Предпоставки: от №1,до17; Мерки за управление: от №1,до17; Мерки за контролиране: от №1,до17; Аспекти на проява: от №1,до17; Числовата оценка на рисковете: от №1,до17; Числова оценка на предпоставките:от №1,до17	8 days
97	III.3.1.3.общи мерки и на контролирането	Мерките по управление на качеството, по опазване на околната среда и по осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, които са описани в техническо предложение	ЕКСПЕРТИТЕ отразени в т. II.1 и III от ТП, както и съответните средствата и продукти отразени в т.1.1. от ТП	8 дни	Wed 4.1.17	Wed 11.1.17	2	Риск: от №1,до17; Предпоставки: от №1,до17; Мерки за управление: от №1,до17; Мерки за контролиране: от №1,до17; Аспекти на проява: от №1,до17; Числовата оценка на рисковете: от №1,до17; Числова оценка на предпоставките:от №1,до17	8 days
98	III.3.1.4.Общи методи - методи на контрол и на управление на рисковете на планирането	Методи на контрол и управление на рисковете, ще се извършат, съгласно описаните и дефинирани рискове, предпоставки, мерки за управление, мерки за контролиране и аспекти на проява отразени в техническото предложение	ЕКСПЕРТИТЕ отразени в т. II.1 и III от ТП, както и съответните средствата и продукти отразени в т.1.1. от ТП	8 дни	Wed 4.1.17	Wed 11.1.17	2	Риск: от №1,до17; Предпоставки: от №1,до17; Мерки за управление: от №1,до17; Мерки за контролиране: от №1,до17; Аспекти на проява: от №1,до17; Числовата оценка на рисковете: от №1,до17; Числова оценка на предпоставките:от №1,до17	8 days
99	III.4.Основен етап на управлението	Основен етап на Управление на Подготвителните дейности, всички дейности и под-дейности, прилагане на съответните ресурси, мерки и методи		8 дни	Wed 4.1.17	Wed 11.1.17			8 days
100	III.4.1.Под-етап на управлението	Под-етап на Управление на Подготвителните дейности, всички дейности и под-дейности, прилагане на съответните ресурси, мерки и методи		8 дни	Wed 4.1.17	Wed 11.1.17			8 days
101	III.4.1.1.дейности на поръчката на управлението	Дейностите на Обособената позиция Дейност №1 и №2	ЕКСПЕРТИТЕ отразени в т. II.1 и III от ТП, както и съответните средствата и продукти отразени в т.1.1. от ТП	8 дни	Wed 4.1.17	Wed 11.1.17	2	Риск: от №1,до17; Предпоставки: от №1,до17; Мерки за управление: от №1,до17; Мерки за контролиране: от №1,до17; Аспекти на проява: от №1,до17; Числовата оценка на рисковете: от №1,до17; Числова оценка на предпоставките:от №1,до17	8 days
102	III.4.1.2.Дейност допълнително дефинирана от участника на управлението	Дейност на осъществяване на Управление на Подготвителните дейности, всички дейности и под-дейности, прилагане на съответните ресурси, мерки и методи		8 дни	Wed 4.1.17	Wed 11.1.17			8 days
103	III.4.1.2.1.под-дейности на управлението	Под-дейност на осъществяване на управлението на Подготвителните дейности, всички дейности и под-дейности, прилагане на съответните ресурси, мерки и методи	ЕКСПЕРТИТЕ отразени в т. II.1 и III от ТП, както и съответните средствата и продукти отразени в т.1.1. от ТП	8 дни	Wed 4.1.17	Wed 11.1.17	2	Риск: от №1,до17; Предпоставки: от №1,до17; Мерки за управление: от №1,до17; Мерки за контролиране: от №1,до17; Аспекти на проява: от №1,до17; Числовата оценка на рисковете: от №1,до17; Числова оценка на предпоставките:от №1,до17	8 days
104	III.4.1.3.общи мерки и на управлението	Мерките по управление на качеството, по опазване на околната среда и по осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, които са описани в техническо предложение	ЕКСПЕРТИТЕ отразени в т. II.1 и III от ТП, както и съответните средствата и продукти отразени в т.1.1. от ТП	8 дни	Wed 4.1.17	Wed 11.1.17	2	Риск: от №1,до17; Предпоставки: от №1,до17; Мерки за управление: от №1,до17; Мерки за контролиране: от №1,до17; Аспекти на проява: от №1,до17; Числовата оценка на рисковете: от №1,до17; Числова оценка на предпоставките:от №1,до17	8 days
105	III.4.1.4.Общи методи - методи на контрол и на управление на рисковете на планирането	Методи на контрол и управление на рисковете, ще се извършат, съгласно описаните и дефинирани рискове, предпоставки, мерки за управление, мерки за контролиране и аспекти на проява отразени в техническото предложение	ЕКСПЕРТИТЕ отразени в т. II.1 и III от ТП, както и съответните средствата и продукти отразени в т.1.1. от ТП	8 дни	Wed 4.1.17	Wed 11.1.17	2	Риск: от №1,до17; Предпоставки: от №1,до17; Мерки за управление: от №1,до17; Мерки за контролиране: от №1,до17; Аспекти на проява: от №1,до17; Числовата оценка на рисковете: от №1,до17; Числова оценка на предпоставките:от №1,до17	8 days
106	III.5.Основен етап на приключването	Основен етап на Приключване на Подготвителните дейности, всички дейности и под-дейности, прилагане на съответните ресурси, мерки и методи		1 ден	Wed 11.1.17	Wed 11.1.17			1 day
107	III.5.1.Под-етап на приключването	Под-етап на Приключване на Подготвителните дейности, всички дейности и под-дейности, прилагане на съответните ресурси, мерки и методи		1 ден	Wed 11.1.17	Wed 11.1.17			1 day
108	III.5.1.1.дейности на поръчката на приключването	Дейностите на Обособената позиция Дейност №1 и №2	ЕКСПЕРТИТЕ отразени в т. II.1 и III от ТП, както и съответните средствата и продукти отразени в т.1.1. от ТП	1 ден	Wed 11.1.17	Wed 11.1.17	85FS-1 day	Риск: от №1,до17; Предпоставки: от №1,до17; Мерки за управление: от №1,до17; Мерки за контролиране: от №1,до17; Аспекти на проява: от №1,до17; Числовата оценка на рисковете: от №1,до17; Числова оценка на предпоставките:от №1,до17	1 day
109	III.5.1.2.Дейност допълнително дефинирана от участника на приключването	Дейност на осъществяване на Приключване на Подготвителните дейности, всички дейности и под-дейности, прилагане на съответните ресурси, мерки и методи		1 ден	Wed 11.1.17	Wed 11.1.17			1 day
110	III.5.1.2.1.под-дейности на приключването	Под-дейност на осъществяване на приключването на Подготвителните дейности, всички дейности и под-дейности, прилагане на съответните ресурси, мерки и методи	ЕКСПЕРТИТЕ отразени в т. II.1 и III от ТП, както и съответните средствата и продукти отразени в т.1.1. от ТП	1 ден	Wed 11.1.17	Wed 11.1.17	85FS-1 day	Риск: от №1,до17; Предпоставки: от №1,до17; Мерки за управление: от №1,до17; Мерки за контролиране: от №1,до17; Аспекти на проява: от №1,до17; Числовата оценка на рисковете: от №1,до17; Числова оценка на предпоставките:от №1,до17	1 day
111	III.5.1.3.общи мерки и на приключването	Мерките по управление на качеството, по опазване на околната среда и по осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, които са описани в техническо предложение	ЕКСПЕРТИТЕ отразени в т. II.1 и III от ТП, както и съответните средствата и продукти отразени в т.1.1. от ТП	1 ден	Wed 11.1.17	Wed 11.1.17	85FS-1 day	Риск: от №1,до17; Предпоставки: от №1,до17; Мерки за управление: от №1,до17; Мерки за контролиране: от №1,до17; Аспекти на проява: от №1,до17; Числовата оценка на рисковете: от №1,до17; Числова оценка на предпоставките:от №1,до17	1 day
112	III.5.1.4.Общи методи - методи на контрол и на управление на рисковете на планирането	Методи на контрол и управление на рисковете, ще се извършат, съгласно описаните и дефинирани рискове, предпоставки, мерки за управление, мерки за контролиране и аспекти на проява отразени в техническото предложение	ЕКСПЕРТИТЕ отразени в т. II.1 и III от ТП, както и съответните средствата и продукти отразени в т.1.1. от ТП	1 ден	Wed 11.1.17	Wed 11.1.17	85FS-1 day	Риск: от №1,до17; Предпоставки: от №1,до17; Мерки за управление: от №1,до17; Мерки за контролиране: от №1,до17; Аспекти на проява: от №1,до17; Числовата оценка на рисковете: от №1,до17; Числова оценка на предпоставките:от №1,до17	1 day
113	IV.ЕТАП НА ЖИЗНЕНИЯ ЦИКЪЛ НА УПРАВЛЕНИЕТО	ЕТАП НА ЖИЗНЕНИЯ ЦИКЪЛ НА УПРАВЛЕНИЕТО ОБХВАЩАШ УПРАВЛЕНИЕТО НА ПОДГОТОВИТЕЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ, ВСИЧКИ ДЕЙНОСТИ И ПОД-ДЕЙНОСТИ, ПРИЛАГАНЕ НА СЪОТВЕТНИТЕ РЕСУРСИ, МЕРКИ И МЕТОДИ		8 дни	Wed 4.1.17	Wed 11.1.17			8 days
114	IV.1.Основен етап на планирането	Основен етап на Планиране на Подготвителните дейности, всички дейности и под-дейности, прилагане на съответните ресурси, мерки и методи		4 дни	Wed 4.1.17	Sat 7.1.17			4 days
115	IV.1.1.Под-етап на планирането	Под-етап на Планиране на Подготвителните дейности, всички дейности и под-дейности, прилагане на съответните ресурси, мерки и методи		4 дни	Wed 4.1.17	Sat 7.1.17			4 days
116	IV.1.1.1.дейности на поръчката на планирането	Дейностите на Обособената позиция Дейност №1 и №2	ЕКСПЕРТИТЕ отразени в т. II.1 и III от ТП, както и съответните средствата и продукти отразени в т.1.1. от ТП	4 дни	Wed 4.1.17	Sat 7.1.17	2	Риск: от №1,до17; Предпоставки: от №1,до17; Мерки за управление: от №1,до17; Мерки за контролиране: от №1,до17; Аспекти на проява: от №1,до17; Числовата оценка на рисковете: от №1,до17; Числова оценка на предпоставките:от №1,до17	4 days
117	IV.1.1.2.Дейност допълнително дефинирана от участника на планирането	Дейност на осъществяване на Планиране на Подготвителните дейности, всички дейности и под-дейности, прилагане на съответните ресурси, мерки и методи		4 дни	Wed 4.1.17	Sat 7.1.17			4 days
118	IV.1.1.2.1.под-дейности на планирането	Под-дейност на осъществяване на Планиране на Подготвителните дейности, всички дейности и под-дейности, прилагане на съответните ресурси, мерки и методи	ЕКСПЕРТИТЕ отразени в т. II.1 и III от ТП, както и съответните средствата и продукти отразени в т.1.1. от ТП	4 дни	Wed 4.1.17	Sat 7.1.17	2	Риск: от №1,до17; Предпоставки: от №1,до17; Мерки за управление: от №1,до17; Мерки за контролиране: от №1,до17; Аспекти на проява: от №1,до17; Числовата оценка на рисковете: от №1,до17; Числова оценка на предпоставките:от №1,до17	4 days
119	IV.1.1.3.общи мерки на планирането	Мерките по управление на качеството, по опазване на околната среда и по осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, които са описани в техническо предложение	ЕКСПЕРТИТЕ отразени в т. II.1 и III от ТП, както и съответните средствата и продукти отразени в т.1.1. от ТП	4 дни	Wed 4.1.17	Sat 7.1.17	2	Риск: от №1,до17; Предпоставки: от №1,до17; Мерки за управление: от №1,до17; Мерки за контролиране: от №1,до17; Аспекти на проява: от №1,до17; Числовата оценка на рисковете: от №1,до17; Числова оценка на предпоставките:от №1,до17	4 days
120	IV.1.1.4.Общи методи - методи на контрол и на управление на рисковете на планирането	Методи на контрол и управление на рисковете, ще се извършат, съгласно описаните и дефинирани рискове, предпоставки, мерки за управление, мерки за контролиране и аспекти на проява отразени в техническото предложение	ЕКСПЕРТИТЕ отразени в т. II.1 и III от ТП, както и съответните средствата и продукти отразени в т.1.1. от ТП	4 дни	Wed 4.1.17	Sat 7.1.17	2	Риск: от №1,до17; Предпоставки: от №1,до17; Мерки за управление: от №1,до17; Мерки за контролиране: от №1,до17; Аспекти на проява: от №1,до17; Числовата оценка на рисковете: от №1,до17; Числова оценка на предпоставките:от №1,до17	4 days
121	IV.2.Основен етап на изпълнението	Основен етап на Изпълнение на Подготвителните дейности, всички дейности и под-дейности, прилагане на съответните ресурси, мерки и методи		8 дни	Wed 4.1.17	Wed 11.1.17			8 days
122	IV.2.1.Под-етап на изпълнението	Под-етап на Изпълнение на Подготвителните дейности, всички дейности и под-дейности, прилагане на съответните ресурси, мерки и методи		8 дни	Wed 4.1.17	Wed 11.1.17			8 days
123	IV.2.1.1.дейности на поръчката на изпълнението	Дейностите на Обособената позиция Дейност №1 и №2	ЕКСПЕРТИТЕ отразени в т. II.1 и III от ТП, както и съответните средствата и продукти отразени в т.1.1. от ТП	8 дни	Wed 4.1.17	Wed 11.1.17	2	Риск: от №1,до17; Предпоставки: от №1,до17; Мерки за управление: от №1,до17; Мерки за контролиране: от №1,до17; Аспекти на проява: от №1,до17; Числовата оценка на рисковете: от №1,до17; Числова оценка на предпоставките:от №1,до17	8 days
124	IV.2.1.2.Дейност допълнително дефинирана от участника на изпълнението	Дейност на осъществяване на Изпълнение на Подготвителните дейности, всички дейности и под-дейности, прилагане на съответните ресурси, мерки и методи		8 дни	Wed 4.1.17	Wed 11.1.17			8 days
125	IV.2.1.2.1.под-дейности на изпълнението	Под-дейност на осъществяване на изпълнение на Подготвителните дейности, всички дейности и под-дейности, прилагане на съответните ресурси, мерки и методи	ЕКСПЕРТИТЕ отразени в т. II.1 и III от ТП, както и съответните средствата и продукти отразени в т.1.1. от ТП	8 дни	Wed 4.1.17	Wed 11.1.17	2	Риск: от №1,до17; Предпоставки: от №1,до17; Мерки за управление: от №1,до17; Мерки за контролиране: от №1,до17; Аспекти на проява: от №1,до17; Числовата оценка на рисковете: от №1,до17; Числова оценка на предпоставките:от №1,до17	8 days
126	IV.2.1.3.общи мерки и на изпълнението	Мерките по управление на качеството, по опазване на околната среда и по осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, които са описани в техническо предложение	ЕКСПЕРТИТЕ отразени в т. II.1 и III от ТП, както и съответните средствата и продукти отразени в т.1.1. от ТП	8 дни	Wed 4.1.17	Wed 11.1.17	2	Риск: от №1,до17; Предпоставки: от №1,до17; Мерки за управление: от №1,до17; Мерки за контролиране: от №1,до17; Аспекти на проява: от №1,до17; Числовата оценка на рисковете: от №1,до17; Числова оценка на предпоставките:от №1,до17	8 days
127	IV.2.1.4.Общи методи - методи на контрол и на управление на рисковете на планирането	Методи на контрол и управление на рисковете, ще се извършат, съгласно описаните и дефинирани рискове, предпоставки, мерки за управление, мерки за контролиране и аспекти на проява отразени в техническото предложение	ЕКСПЕРТИТЕ отразени в т. II.1 и III от ТП, както и съответните средствата и продукти отразени в т.1.1. от ТП	8 дни	Wed 4.1.17	Wed 11.1.17	2	Риск: от №1,до17; Предпоставки: от №1,до17; Мерки за управление: от №1,до17; Мерки за контролиране: от №1,до17; Аспекти на проява: от №1,до17; Числовата оценка на рисковете: от №1,до17; Числова оценка на предпоставките:от №1,до17	8 days
128	IV.3.Основен етап на контролирането	Основен етап на Контролиране на Подготвителните дейности, всички дейности и под-дейности, прилагане на съответните ресурси, мерки и методи		8 дни	Wed 4.1.17	Wed 11.1.17			8 days
129	IV.3.1.Под-етап на контролирането	Под-етап на Контролиране на Подготвителните дейности, всички дейности и под-дейности, прилагане на съответните ресурси, мерки и методи		8 дни	Wed 4.1.17	Wed 11.1.17			8 days
130	IV.3.1.1.дейности на поръчката на контролирането	Дейностите на Обособената позиция Дейност №1 и №2	ЕКСПЕРТИТЕ отразени в т. II.1 и III от ТП, както и съответните средствата и продукти отразени в т.1.1. от ТП	8 дни	Wed 4.1.17	Wed 11.1.17	2	Риск: от №1,до17; Предпоставки: от №1,до17; Мерки за управление: от №1,до17; Мерки за контролиране: от №1,до17; Аспекти на проява: от №1,до17; Числовата оценка на рисковете: от №1,до17; Числова оценка на предпоставките:от №1,до17	8 days
131	IV.3.1.2.Дейност допълнително дефинирана от участника на контролирането	Дейност на осъществяване на Контролиране на Подготвителните дейности, всички дейности и под-дейности, прилагане на съответните ресурси, мерки и методи		8 дни	Wed 4.1.17	Wed 11.1.17			8 days
132	IV.3.1.2.1.под-дейности на контролирането	Под-дейност на осъществяване на контролирането на Подготвителните дейности, всички дейности и под-дейности, прилагане на съответните ресурси, мерки и методи	ЕКСПЕРТИТЕ отразени в т. II.1 и III от ТП, както и съответните средствата и продукти отразени в т.1.1. от ТП	8 дни	Wed 4.1.17	Wed 11.1.17	2	Риск: от №1,до17; Предпоставки: от №1,до17; Мерки за управление: от №1,до17; Мерки за контролиране: от №1,до17; Аспекти на проява: от №1,до17; Числовата оценка на рисковете: от №1,до17; Числова оценка на предпоставките:от №1,до17	8 days

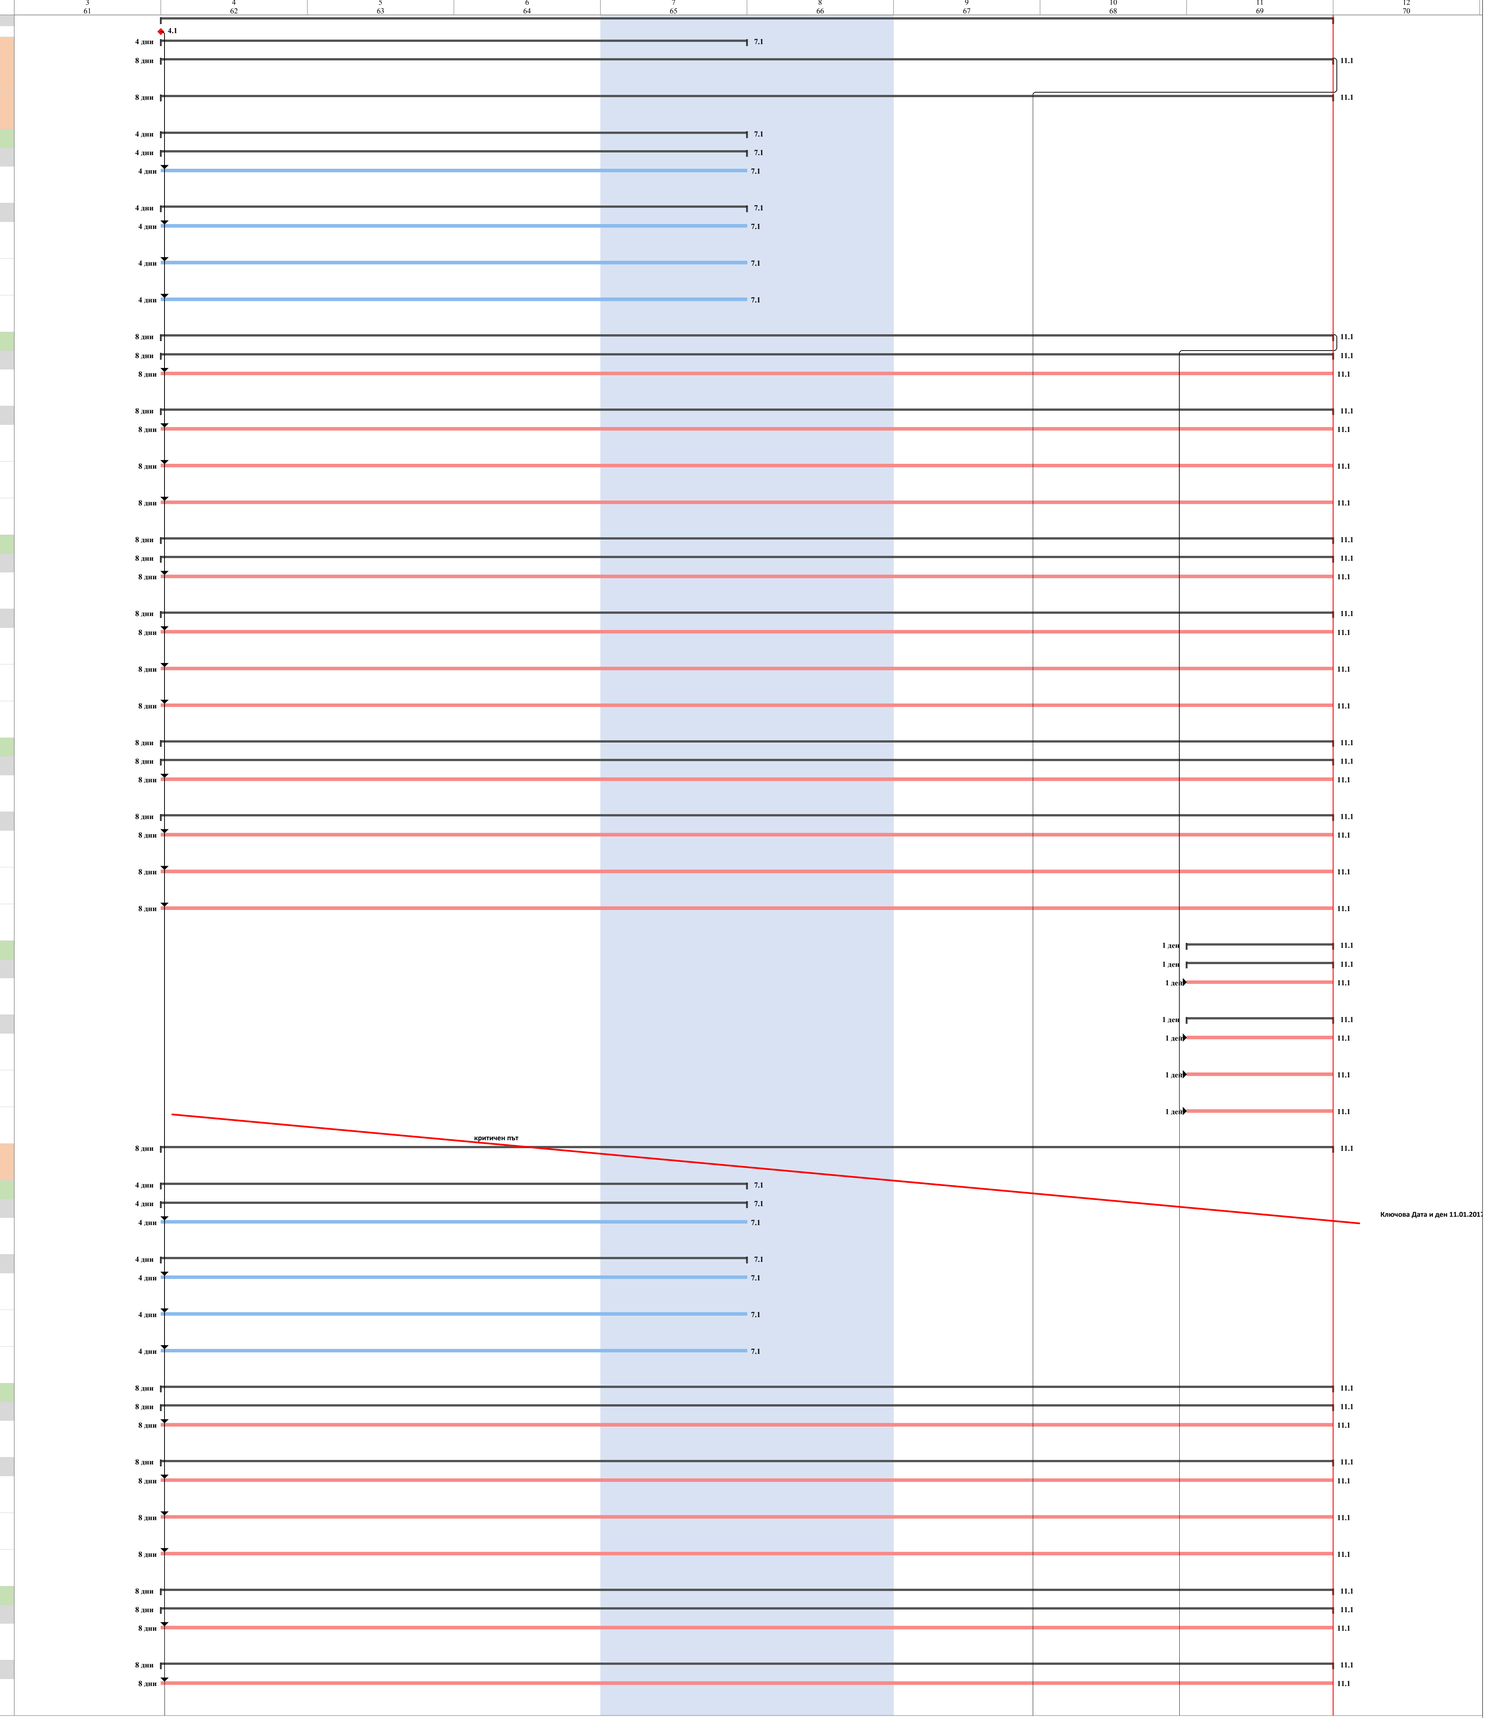
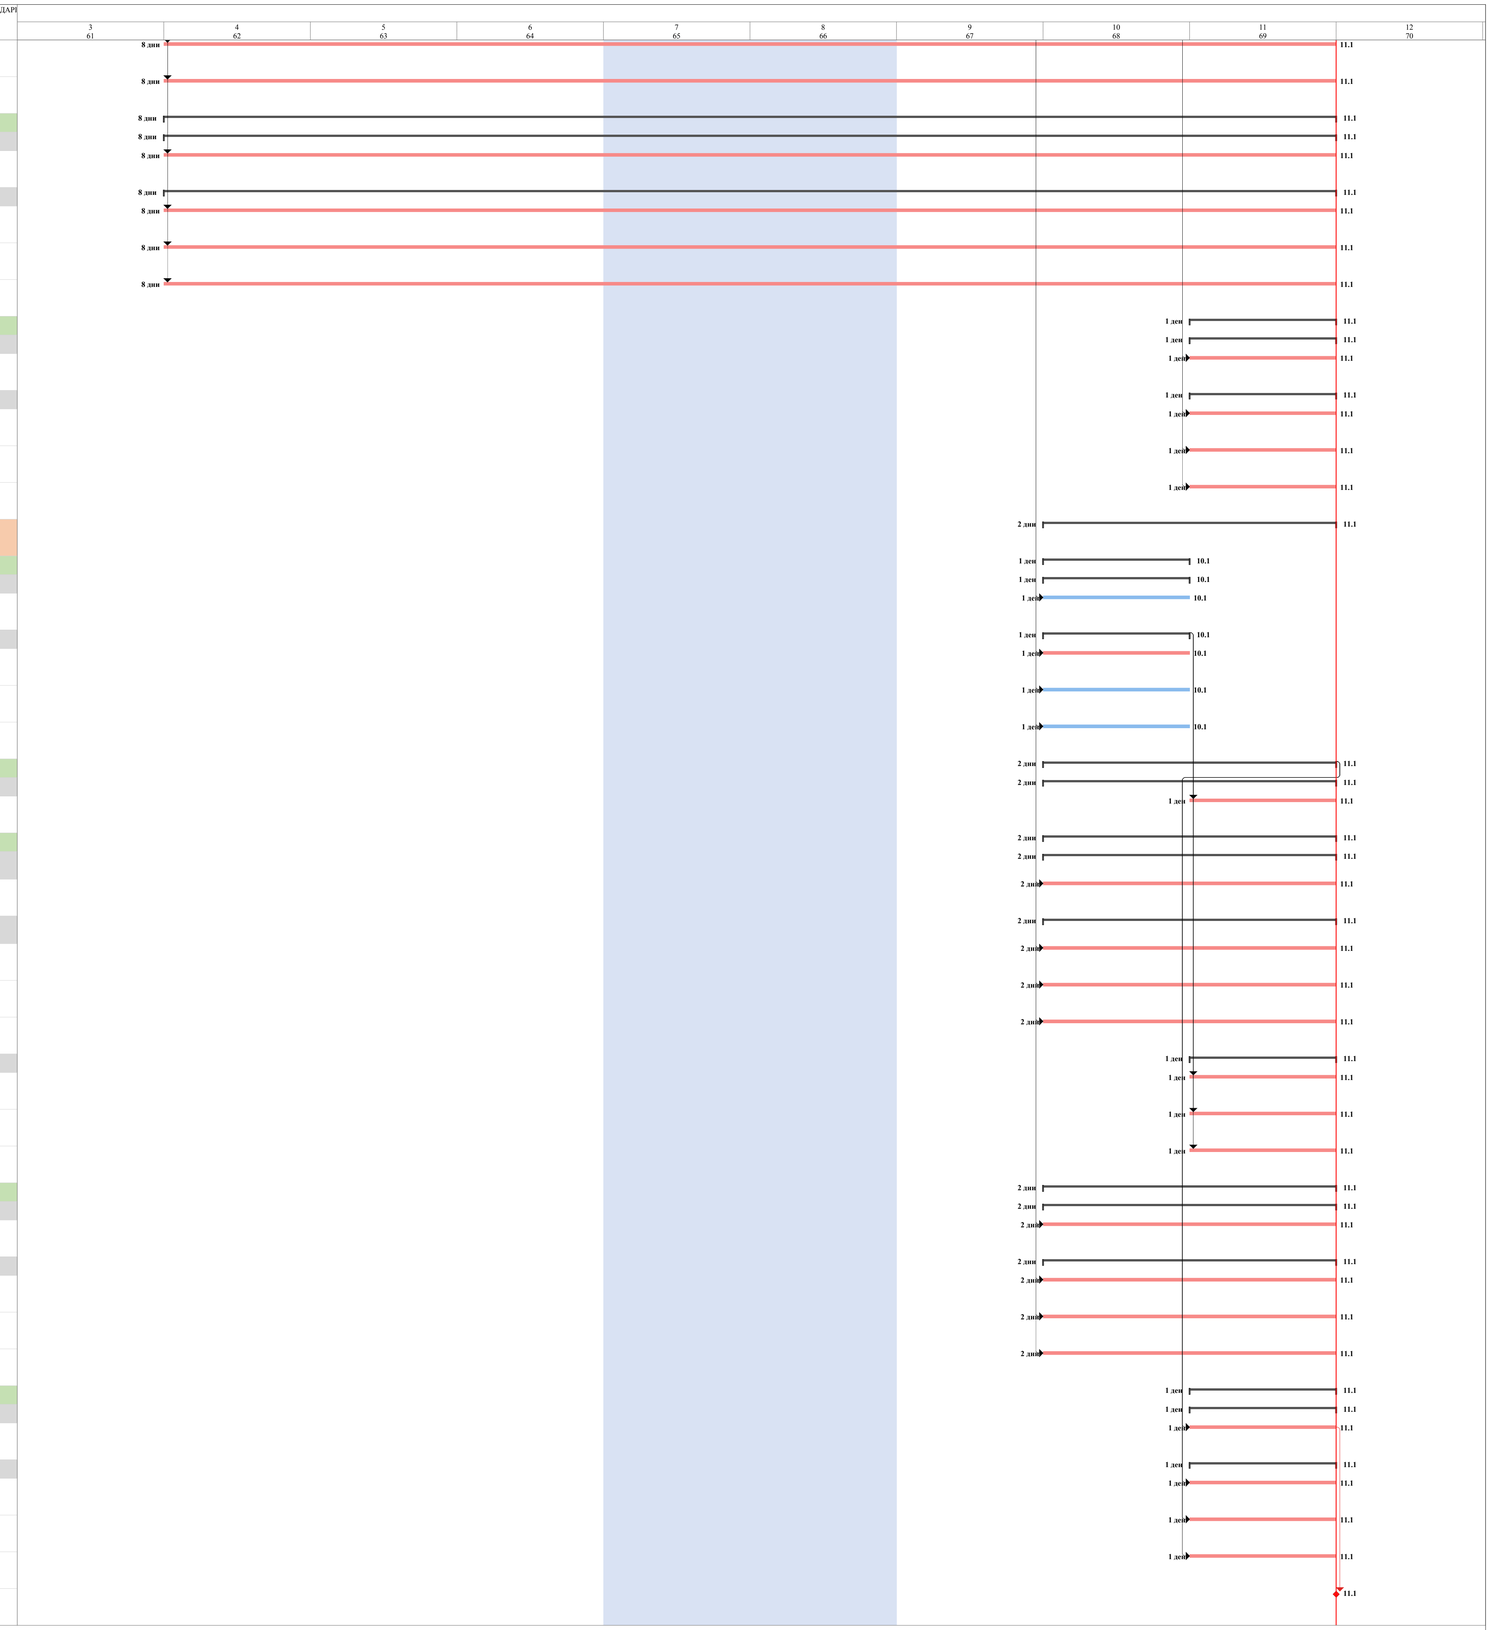
ID	№ и Наименования на задължителните елементи	Дейности и действия	организация на персонала и ресурсите	Календар дни	НАЧАЛО	КРАЙ	ПОСЛЕДОВАТЕЛИ	Рискове	КАЛЕНДАРНИ ДНИ
133	IV.3.1.3.общи мерки и на контролирането	Мерките по управление на качеството, по опазване на околната среда и по осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, които са описани в техническо предложение	ЕКСПЕРТИТЕ отразени в т. II.1 и III от ТП, както и съответните средства и продукти отразени в т.1.1. от ТП	8 дни	Wed 4.1.17	Wed 11.1.17	2	Риск: от №1,до17; Предпоставки: от №1,до17; Мерки за управление: от №1,до17; Мерки за контролиране: от №1,до17; Аспекти на проява: от №1,до17; Числовата оценка на рисковете: от №1,до17; Числова оценка на предпоставките:от №1,до17	8 days
134	IV.3.1.4.Общи методи - методи на контрол и на управление на рисковете на планираното	Методи на контрол и управление на рисковете, ще се извършват, съгласно описание и дефинирани рискове, предпоставки, мерки за управление, мерки за контролиране и аспекти на проява отразени в техническото предложение	ЕКСПЕРТИТЕ отразени в т. II.1 и III от ТП, както и съответните средства и продукти отразени в т.1.1. от ТП	8 дни	Wed 4.1.17	Wed 11.1.17	2	Риск: от №1,до17; Предпоставки: от №1,до17; Мерки за управление: от №1,до17; Мерки за контролиране: от №1,до17; Аспекти на проява: от №1,до17; Числовата оценка на рисковете: от №1,до17; Числова оценка на предпоставките:от №1,до17	8 days
135	IV.4.Основен етап на управлението	Основен етап на Управление на Подготвителните дейности, всички дейности и под-дейности, прилагане на съответните ресурси, мерки и методи		8 дни	Wed 4.1.17	Wed 11.1.17			8 days
136	IV.4.1.Под-етап на управлението	Под-етап на Управление на Подготвителните дейности, всички дейности и под-дейности, прилагане на съответните ресурси, мерки и методи		8 дни	Wed 4.1.17	Wed 11.1.17			8 days
137	IV.4.1.1.дейности на поръчката на управлението	Дейностите на Обособената позиция Дейност №1 и №2	ЕКСПЕРТИТЕ отразени в т. II.1 и III от ТП, както и съответните средства и продукти отразени в т.1.1. от ТП	8 дни	Wed 4.1.17	Wed 11.1.17	2	Риск: от №1,до17; Предпоставки: от №1,до17; Мерки за управление: от №1,до17; Мерки за контролиране: от №1,до17; Аспекти на проява: от №1,до17; Числовата оценка на рисковете: от №1,до17; Числова оценка на предпоставките:от №1,до17	8 days
138	IV.4.1.2.Дейност допълнително дефинирана от участника на управлението	Дейност на осъществяване на Управление на Подготвителните дейности, всички дейности и под-дейности, прилагане на съответните ресурси, мерки и методи		8 дни	Wed 4.1.17	Wed 11.1.17			8 days
139	IV.4.1.2.1.под-дейности на управлението	Под-дейност на осъществяване на управлението на Подготвителните дейности, всички дейности и под-дейности, прилагане на съответните ресурси, мерки и методи	ЕКСПЕРТИТЕ отразени в т. II.1 и III от ТП, както и съответните средства и продукти отразени в т.1.1. от ТП	8 дни	Wed 4.1.17	Wed 11.1.17	2	Риск: от №1,до17; Предпоставки: от №1,до17; Мерки за управление: от №1,до17; Мерки за контролиране: от №1,до17; Аспекти на проява: от №1,до17; Числовата оценка на рисковете: от №1,до17; Числова оценка на предпоставките:от №1,до17	8 days
140	IV.4.1.3.общи мерки и на управлението	Мерките по управление на качеството, по опазване на околната среда и по осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, които са описани в техническо предложение	ЕКСПЕРТИТЕ отразени в т. II.1 и III от ТП, както и съответните средства и продукти отразени в т.1.1. от ТП	8 дни	Wed 4.1.17	Wed 11.1.17	2	Риск: от №1,до17; Предпоставки: от №1,до17; Мерки за управление: от №1,до17; Мерки за контролиране: от №1,до17; Аспекти на проява: от №1,до17; Числовата оценка на рисковете: от №1,до17; Числова оценка на предпоставките:от №1,до17	8 days
141	IV.4.1.4.Общи методи - методи на контрол и на управление на рисковете на планираното	Методи на контрол и управление на рисковете, ще се извършват, съгласно описание и дефинирани рискове, предпоставки, мерки за управление, мерки за контролиране и аспекти на проява отразени в техническото предложение	ЕКСПЕРТИТЕ отразени в т. II.1 и III от ТП, както и съответните средства и продукти отразени в т.1.1. от ТП	8 дни	Wed 4.1.17	Wed 11.1.17	2	Риск: от №1,до17; Предпоставки: от №1,до17; Мерки за управление: от №1,до17; Мерки за контролиране: от №1,до17; Аспекти на проява: от №1,до17; Числовата оценка на рисковете: от №1,до17; Числова оценка на предпоставките:от №1,до17	8 days
142	IV.5.Основен етап на приключването	Основен етап на Приключване на Подготвителните дейности, всички дейности и под-дейности, прилагане на съответните ресурси, мерки и методи		1 ден	Wed 11.1.17	Wed 11.1.17			1 day
143	IV.5.1.Под-етап на приключването	Под-етап на Приключване на Подготвителните дейности, всички дейности и под-дейности, прилагане на съответните ресурси, мерки и методи		1 ден	Wed 11.1.17	Wed 11.1.17			1 day
144	IV.5.1.1.дейности на поръчката на приключването	Дейностите на Обособената позиция Дейност №1 и №2	ЕКСПЕРТИТЕ отразени в т. II.1 и III от ТП, както и съответните средства и продукти отразени в т.1.1. от ТП	1 ден	Wed 11.1.17	Wed 11.1.17	85FS-1 day	Риск: от №1,до17; Предпоставки: от №1,до17; Мерки за управление: от №1,до17; Мерки за контролиране: от №1,до17; Аспекти на проява: от №1,до17; Числовата оценка на рисковете: от №1,до17; Числова оценка на предпоставките:от №1,до17	1 day
145	IV.5.1.2.Дейност допълнително дефинирана от участника на приключването	Дейност на осъществяване на Приключване на Подготвителните дейности, всички дейности и под-дейности, прилагане на съответните ресурси, мерки и методи		1 ден	Wed 11.1.17	Wed 11.1.17			1 day
146	IV.5.1.2.1.под-дейности на приключването	Под-дейност на осъществяване на приключването на Подготвителните дейности, всички дейности и под-дейности, прилагане на съответните ресурси, мерки и методи	ЕКСПЕРТИТЕ отразени в т. II.1 и III от ТП, както и съответните средства и продукти отразени в т.1.1. от ТП	1 ден	Wed 11.1.17	Wed 11.1.17	85FS-1 day	Риск: от №1,до17; Предпоставки: от №1,до17; Мерки за управление: от №1,до17; Мерки за контролиране: от №1,до17; Аспекти на проява: от №1,до17; Числовата оценка на рисковете: от №1,до17; Числова оценка на предпоставките:от №1,до17	1 day
147	IV.5.1.3.общи мерки и на приключването	Мерките по управление на качеството, по опазване на околната среда и по осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, които са описани в техническо предложение	ЕКСПЕРТИТЕ отразени в т. II.1 и III от ТП, както и съответните средства и продукти отразени в т.1.1. от ТП	1 ден	Wed 11.1.17	Wed 11.1.17	85FS-1 day	Риск: от №1,до17; Предпоставки: от №1,до17; Мерки за управление: от №1,до17; Мерки за контролиране: от №1,до17; Аспекти на проява: от №1,до17; Числовата оценка на рисковете: от №1,до17; Числова оценка на предпоставките:от №1,до17	1 day
148	IV.5.1.4.Общи методи - методи на контрол и на управление на рисковете на планираното	Методи на контрол и управление на рисковете, ще се извършват, съгласно описание и дефинирани рискове, предпоставки, мерки за управление, мерки за контролиране и аспекти на проява отразени в техническото предложение	ЕКСПЕРТИТЕ отразени в т. II.1 и III от ТП, както и съответните средства и продукти отразени в т.1.1. от ТП	1 ден	Wed 11.1.17	Wed 11.1.17	85FS-1 day	Риск: от №1,до17; Предпоставки: от №1,до17; Мерки за управление: от №1,до17; Мерки за контролиране: от №1,до17; Аспекти на проява: от №1,до17; Числовата оценка на рисковете: от №1,до17; Числова оценка на предпоставките:от №1,до17	1 day
149	V.ЕТАП НА ЖИЗНЕНИЯ ЦИКЪЛ НА ПРИКЛЮЧВАНЕТО	ЕТАП НА ЖИЗНЕНИЯ ЦИКЪЛ НА ПРИКЛЮЧВАНЕТО ОБХВАЩАЩИ ПРИКЛЮЧВАНЕТО НА ПОДГОТВИТЕЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ, ВСИЧКИ ДЕЙНОСТИ И ПОД-ДЕЙНОСТИ, ПРИЛАГАНЕ НА СЪОТВЕТНИТЕ РЕСУРСИ, МЕРКИ И МЕТОДИ		2 дни	Tue 10.1.17	Wed 11.1.17			2 days
150	V.1.Основен етап на планирането	Основен етап на Планиране на Подготвителните дейности, всички дейности и под-дейности, прилагане на съответните ресурси, мерки и методи		1 ден	Tue 10.1.17	Tue 10.1.17			1 day
151	V.1.1.Под-етап на планирането	Под-етап на Планиране на Подготвителните дейности, всички дейности и под-дейности, прилагане на съответните ресурси, мерки и методи		1 ден	Tue 10.1.17	Tue 10.1.17			1 day
152	V.1.1.1.дейности на поръчката на планирането	Дейностите на Обособената позиция Дейност №1 и №2	ЕКСПЕРТИТЕ отразени в т. II.1 и III от ТП, както и съответните средства и продукти отразени в т.1.1. от ТП	1 ден	Tue 10.1.17	Tue 10.1.17	39FS-2 days	Риск: от №1,до17; Предпоставки: от №1,до17; Мерки за управление: от №1,до17; Мерки за контролиране: от №1,до17; Аспекти на проява: от №1,до17; Числовата оценка на рисковете: от №1,до17; Числова оценка на предпоставките:от №1,до17	1 day
153	V.1.1.2.Дейност допълнително дефинирана от участника на планирането	Дейност на осъществяване на Планиране на Подготвителните дейности, всички дейности и под-дейности, прилагане на съответните ресурси, мерки и методи		1 ден	Tue 10.1.17	Tue 10.1.17			1 day
154	V.1.1.2.1.под-дейности на планирането	Под-дейност на осъществяване на Планиране на Подготвителните дейности, всички дейности и под-дейности, прилагане на съответните ресурси, мерки и методи	ЕКСПЕРТИТЕ отразени в т. II.1 и III от ТП, както и съответните средства и продукти отразени в т.1.1. от ТП	1 ден	Tue 10.1.17	Tue 10.1.17	39FS-2 days	Риск: от №1,до17; Предпоставки: от №1,до17; Мерки за управление: от №1,до17; Мерки за контролиране: от №1,до17; Аспекти на проява: от №1,до17; Числовата оценка на рисковете: от №1,до17; Числова оценка на предпоставките:от №1,до17	1 day
155	V.1.1.3.общи мерки на планирането	Мерките по управление на качеството, по опазване на околната среда и по осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, които са описани в техническо предложение	ЕКСПЕРТИТЕ отразени в т. II.1 и III от ТП, както и съответните средства и продукти отразени в т.1.1. от ТП	1 ден	Tue 10.1.17	Tue 10.1.17	39FS-2 days	Риск: от №1,до17; Предпоставки: от №1,до17; Мерки за управление: от №1,до17; Мерки за контролиране: от №1,до17; Аспекти на проява: от №1,до17; Числовата оценка на рисковете: от №1,до17; Числова оценка на предпоставките:от №1,до17	1 day
156	V.1.1.4.Общи методи - методи на контрол и на управление на рисковете на планираното	Методи на контрол и управление на рисковете, ще се извършват, съгласно описание и дефинирани рискове, предпоставки, мерки за управление, мерки за контролиране и аспекти на проява отразени в техническото предложение	ЕКСПЕРТИТЕ отразени в т. II.1 и III от ТП, както и съответните средства и продукти отразени в т.1.1. от ТП	1 ден	Tue 10.1.17	Tue 10.1.17	39FS-2 days	Риск: от №1,до17; Предпоставки: от №1,до17; Мерки за управление: от №1,до17; Мерки за контролиране: от №1,до17; Аспекти на проява: от №1,до17; Числовата оценка на рисковете: от №1,до17; Числова оценка на предпоставките:от №1,до17	1 day
157	V.2.Основен етап на изпълнението	Основен етап на Изпълнение на Подготвителните дейности, всички дейности и под-дейности, прилагане на съответните ресурси, мерки и методи		2 дни	Tue 10.1.17	Wed 11.1.17			2 days
158	V.2.1.Под-етап на изпълнението	Под-етап на Изпълнение на Подготвителните дейности, всички дейности и под-дейности, прилагане на съответните ресурси, мерки и методи		2 дни	Tue 10.1.17	Wed 11.1.17			2 days
159	V.2.1.1.дейности на поръчката на изпълнението	Дейностите на Обособената позиция Дейност №1 и №2	ЕКСПЕРТИТЕ отразени в т. II.1 и III от ТП, както и съответните средства и продукти отразени в т.1.1. от ТП	1 ден	Wed 11.1.17	Wed 11.1.17	153	Риск: от №1,до17; Предпоставки: от №1,до17; Мерки за управление: от №1,до17; Мерки за контролиране: от №1,до17; Аспекти на проява: от №1,до17; Числовата оценка на рисковете: от №1,до17; Числова оценка на предпоставките:от №1,до17	1 day
160	V.3.Основен етап на контролирането	Дейност на осъществяване на Изпълнение на Подготвителните дейности, всички дейности и под-дейности, прилагане на съответните ресурси, мерки и методи		2 дни	Tue 10.1.17	Wed 11.1.17			2 days
161	V.3.1.Под-етап на контролирането	Под-дейност на осъществяване на изпълнение на Подготвителните дейности, всички дейности и под-дейности, прилагане на съответните ресурси, мерки и методи	ЕКСПЕРТИТЕ отразени в т. II.1 и III от ТП, както и съответните средства и продукти отразени в т.1.1. от ТП	2 дни	Tue 10.1.17	Wed 11.1.17			2 days
162	V.3.1.1.дейности на поръчката на контролирането	Мерките по управление на качеството, по опазване на околната среда и по осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, които са описани в техническо предложение	ЕКСПЕРТИТЕ отразени в т. II.1 и III от ТП, както и съответните средства и продукти отразени в т.1.1. от ТП	2 дни	Tue 10.1.17	Wed 11.1.17	39FS-2 days	Риск: от №1,до17; Предпоставки: от №1,до17; Мерки за управление: от №1,до17; Мерки за контролиране: от №1,до17; Аспекти на проява: от №1,до17; Числовата оценка на рисковете: от №1,до17; Числова оценка на предпоставките:от №1,до17	2 days
163	V.3.1.2.Дейност допълнително дефинирана от участника на контролирането	Методи на контрол и управление на рисковете, ще се извършват, съгласно описание и дефинирани рискове, предпоставки, мерки за управление, мерки за контролиране и аспекти на проява отразени в техническото предложение	ЕКСПЕРТИТЕ отразени в т. II.1 и III от ТП, както и съответните средства и продукти отразени в т.1.1. от ТП	2 дни	Tue 10.1.17	Wed 11.1.17			2 days
164	V.3.1.2.1.под-дейности на контролирането	Основен етап на Контролиране на Подготвителните дейности, всички дейности и под-дейности, прилагане на съответните ресурси, мерки и методи		2 дни	Tue 10.1.17	Wed 11.1.17	39FS-2 days	Риск: от №1,до17; Предпоставки: от №1,до17; Мерки за управление: от №1,до17; Мерки за контролиране: от №1,до17; Аспекти на проява: от №1,до17; Числовата оценка на рисковете: от №1,до17; Числова оценка на предпоставките:от №1,до17	2 days
165	V.3.1.3.общи мерки и на контролирането	Под-етап на Контролиране на Подготвителните дейности, всички дейности и под-дейности, прилагане на съответните ресурси, мерки и методи		2 дни	Tue 10.1.17	Wed 11.1.17	39FS-2 days	Риск: от №1,до17; Предпоставки: от №1,до17; Мерки за управление: от №1,до17; Мерки за контролиране: от №1,до17; Аспекти на проява: от №1,до17; Числовата оценка на рисковете: от №1,до17; Числова оценка на предпоставките:от №1,до17	2 days
166	V.3.1.4.Общи методи - методи на контрол и на управление на рисковете на планираното	Дейностите на Обособената позиция Дейност №1 и №2	ЕКСПЕРТИТЕ отразени в т. II.1 и III от ТП, както и съответните средства и продукти отразени в т.1.1. от ТП	2 дни	Tue 10.1.17	Wed 11.1.17	39FS-2 days	Риск: от №1,до17; Предпоставки: от №1,до17; Мерки за управление: от №1,до17; Мерки за контролиране: от №1,до17; Аспекти на проява: от №1,до17; Числовата оценка на рисковете: от №1,до17; Числова оценка на предпоставките:от №1,до17	2 days
167	V.2.1.2.Дейност допълнително дефинирана от участника на изпълнението	Дейност на осъществяване на Контролиране на Подготвителните дейности, всички дейности и под-дейности, прилагане на съответните ресурси, мерки и методи		1 ден	Wed 11.1.17	Wed 11.1.17			1 day
168	V.2.1.3.под-дейности на изпълнението	Под-дейност на осъществяване на контролирането на Подготвителните дейности, всички дейности и под-дейности, прилагане на съответните ресурси, мерки и методи	ЕКСПЕРТИТЕ отразени в т. II.1 и III от ТП, както и съответните средства и продукти отразени в т.1.1. от ТП	1 ден	Wed 11.1.17	Wed 11.1.17	153	Риск: от №1,до17; Предпоставки: от №1,до17; Мерки за управление: от №1,до17; Мерки за контролиране: от №1,до17; Аспекти на проява: от №1,до17; Числовата оценка на рисковете: от №1,до17; Числова оценка на предпоставките:от №1,до17	1 day
169	V.2.1.4.общи мерки и на изпълнението	Мерките по управление на качеството, по опазване на околната среда и по осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, които са описани в техническо предложение	ЕКСПЕРТИТЕ отразени в т. II.1 и III от ТП, както и съответните средства и продукти отразени в т.1.1. от ТП	1 ден	Wed 11.1.17	Wed 11.1.17	153	Риск: от №1,до17; Предпоставки: от №1,до17; Мерки за управление: от №1,до17; Мерки за контролиране: от №1,до17; Аспекти на проява: от №1,до17; Числовата оценка на рисковете: от №1,до17; Числова оценка на предпоставките:от №1,до17	1 day
170	V.2.1.5.Общи методи - методи на контрол и на управление на рисковете на планираното	Методи на контрол и управление на рисковете, ще се извършват, съгласно описание и дефинирани рискове, предпоставки, мерки за управление, мерки за контролиране и аспекти на проява отразени в техническото предложение	ЕКСПЕРТИТЕ отразени в т. II.1 и III от ТП, както и съответните средства и продукти отразени в т.1.1. от ТП	1 ден	Wed 11.1.17	Wed 11.1.17	153	Риск: от №1,до17; Предпоставки: от №1,до17; Мерки за управление: от №1,до17; Мерки за контролиране: от №1,до17; Аспекти на проява: от №1,до17; Числовата оценка на рисковете: от №1,до17; Числова оценка на предпоставките:от №1,до17	1 day
171	V.4.Основен етап на управлението	Основен етап на Управление на Подготвителните дейности, всички дейности и под-дейности, прилагане на съответните ресурси, мерки и методи		2 дни	Tue 10.1.17	Wed 11.1.17			2 days
172	V.4.1.Под-етап на управлението	Под-етап на Управление на Подготвителните дейности, всички дейности и под-дейности, прилагане на съответните ресурси, мерки и методи		2 дни	Tue 10.1.17	Wed 11.1.17			2 days
173	V.4.1.1.дейности на поръчката на управлението	Дейностите на Обособената позиция Дейност №1 и №2	ЕКСПЕРТИТЕ отразени в т. II.1 и III от ТП, както и съответните средства и продукти отразени в т.1.1. от ТП	2 дни	Tue 10.1.17	Wed 11.1.17	39FS-2 days	Риск: от №1,до17; Предпоставки: от №1,до17; Мерки за управление: от №1,до17; Мерки за контролиране: от №1,до17; Аспекти на проява: от №1,до17; Числовата оценка на рисковете: от №1,до17; Числова оценка на предпоставките:от №1,до17	2 days
174	V.4.1.2.Дейност допълнително дефинирана от участника на управлението	Дейност на осъществяване на Управление на Подготвителните дейности, всички дейности и под-дейности, прилагане на съответните ресурси, мерки и методи		2 дни	Tue 10.1.17	Wed 11.1.17			2 days
175	V.4.1.2.1.под-дейности на управлението	Под-дейност на осъществяване на управлението на Подготвителните дейности, всички дейности и под-дейности, прилагане на съответните ресурси, мерки и методи	ЕКСПЕРТИТЕ отразени в т. II.1 и III от ТП, както и съответните средства и продукти отразени в т.1.1. от ТП	2 дни	Tue 10.1.17	Wed 11.1.17	39FS-2 days	Риск: от №1,до17; Предпоставки: от №1,до17; Мерки за управление: от №1,до17; Мерки за контролиране: от №1,до17; Аспекти на проява: от №1,до17; Числовата оценка на рисковете: от №1,до17; Числова оценка на предпоставките:от №1,до17	2 days
176	V.4.1.3.общи мерки и на управлението	Мерките по управление на качеството, по опазване на околната среда и по осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, които са описани в техническо предложение	ЕКСПЕРТИТЕ отразени в т. II.1 и III от ТП, както и съответните средства и продукти отразени в т.1.1. от ТП	2 дни	Tue 10.1.17	Wed 11.1.17	39FS-2 days	Риск: от №1,до17; Предпоставки: от №1,до17; Мерки за управление: от №1,до17; Мерки за контролиране: от №1,до17; Аспекти на проява: от №1,до17; Числовата оценка на рисковете: от №1,до17; Числова оценка на предпоставките:от №1,до17	2 days
177	V.4.1.4.Общи методи - методи на контрол и на управление на рисковете на планираното	Методи на контрол и управление на рисковете, ще се извършват, съгласно описание и дефинирани рискове, предпоставки, мерки за управление, мерки за контролиране и аспекти на проява отразени в техническото предложение	ЕКСПЕРТИТЕ отразени в т. II.1 и III от ТП, както и съответните средства и продукти отразени в т.1.1. от ТП	2 дни	Tue 10.1.17	Wed 11.1.17	39FS-2 days	Риск: от №1,до17; Предпоставки: от №1,до17; Мерки за управление: от №1,до17; Мерки за контролиране: от №1,до17; Аспекти на проява: от №1,до17; Числовата оценка на рисковете: от №1,до17; Числова оценка на предпоставките:от №1,до17	2 days
178	V.5.Основен етап на приключването	Основен етап на Приключване на Подготвителните дейности, всички дейности и под-дейности, прилагане на съответните ресурси, мерки и методи		1 ден	Wed 11.1.17	Wed 11.1.17			1 day
179	V.5.1.Под-етап на приключването	Под-етап на Приключване на Подготвителните дейности, всички дейности и под-дейности, прилагане на съответните ресурси, мерки и методи		1 ден	Wed 11.1.17	Wed 11.1.17			1 day
180	V.5.1.1.дейности на поръчката на приключването	Дейностите на Обособената позиция Дейност №1 и №2	ЕКСПЕРТИТЕ отразени в т. II.1 и III от ТП, както и съответните средства и продукти отразени в т.1.1. от ТП	1 ден	Wed 11.1.17	Wed 11.1.17	157FS-1 day	Риск: от №1,до17; Предпоставки: от №1,до17; Мерки за управление: от №1,до17; Мерки за контролиране: от №1,до17; Аспекти на проява: от №1,до17; Числовата оценка на рисковете: от №1,до17; Числова оценка на предпоставките:от №1,до17	1 day
181	V.5.1.2.Дейност допълнително дефинирана от участника на приключването	Дейност на осъществяване на Приключване на Подготвителните дейности, всички дейности и под-дейности, прилагане на съответните ресурси, мерки и методи		1 ден	Wed 11.1.17	Wed 11.1.17			1 day
182	V.5.1.2.1.под-дейности на приключването	Под-дейност на осъществяване на приключването на Подготвителните дейности, всички дейности и под-дейности, прилагане на съответните ресурси, мерки и методи	ЕКСПЕРТИТЕ отразени в т. II.1 и III от ТП, както и съответните средства и продукти отразени в т.1.1. от ТП	1 ден	Wed 11.1.17	Wed 11.1.17	157FS-1 day	Риск: от №1,до17; Предпоставки: от №1,до17; Мерки за управление: от №1,до17; Мерки за контролиране: от №1,до17; Аспекти на проява: от №1,до17; Числовата оценка на рисковете: от №1,до17; Числова оценка на предпоставките:от №1,до17	1 day
183	V.5.1.3.общи мерки и на приключването	Мерките по управление на качеството, по опазване на околната среда и по осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, които са описани в техническо предложение	ЕКСПЕРТИТЕ отразени в т. II.1 и III от ТП, както и съответните средства и продукти отразени в т.1.1. от ТП	1 ден	Wed 11.1.17	Wed 11.1.17	157FS-1 day	Риск: от №1,до17; Предпоставки: от №1,до17; Мерки за управление: от №1,до17; Мерки за контролиране: от №1,до17; Аспекти на проява: от №1,до17; Числовата оценка на рисковете: от №1,до17; Числова оценка на предпоставките:от №1,до17	1 day
184	V.5.1.4.Общи методи - методи на контрол и на управление на рисковете на планираното	Методи на контрол и управление на рисковете, ще се извършват, съгласно описание и дефинирани рискове, предпоставки, мерки за управление, мерки за контролиране и аспекти на проява отразени в техническото предложение	ЕКСПЕРТИТЕ отразени в т. II.1 и III от ТП, както и съответните средства и продукти отразени в т.1.1. от ТП	1 ден	Wed 11.1.17	Wed 11.1.17	157FS-1 day	Риск: от №1,до17; Предпоставки: от №1,до17; Мерки за управление: от №1,до17; Мерки за контролиране: от №1,до17; Аспекти на проява: от №1,до17; Числовата оценка на рисковете: от №1,до17; Числова оценка на предпоставките:от №1,до17	1 day
185	V.5.1.5.Дейности на етап гаранционен срок и на етап след гаранционен срок	дейности осъществяване на етап на гаранционната отговорност в гаранционния срок, така и дейности осъществяване на етап след гаранционна отговорност в съответствие с действащото законодателство	ЕКСПЕРТИТЕ отразени в т. II.1 и III от ТП, както и съответните средства и продукти отразени в т.1.1. от ТП	0 дни	Wed 11.1.17	Wed 11.1.17	180	Риск: от №1,до17; Предпоставки: от №1,до17; Мерки за управление: от №1,до17; Мерки за контролиране: от №1,до17; Аспекти на проява: от №1,до17; Числовата оценка на рисковете: от №1,до17; Числова оценка на предпоставките:от №1,до17	0 days
